



RAPORT O STANIE MIASTA

RZESZOWA ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

RZESZOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2022 rok

Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok:


W roku 2022 dla potrzeb Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 8 200 000 zł.

- 4 100 000 zł na projekty z Kategorii I - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
- 3 280 000 zł na projekty z Kategorii II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
- 820 000 zł na projekty z Kategorii III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Mieszkańcy mogli wybierać po jednym z 102 projektów w trzech kategoriach. Do realizacji wybrano 38 zadań oraz dodatkowo przyznano bonus dla najaktywniejszego osiedla. Głosowanie odbywało się pomiędzy 10 września do 8 października 2021 r. W głosowaniu oddano 70 902 głosów, w tym liczba ważnie oddanych głosów: 70 883, z czego zdecydowaną większość drogą internetową – 70 370.


W ramach Kategorii I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej do realizacji zakwalifikowano 4 zadania. Z Kategorii II – z zakresu budowy, modernizacji lub remontu infrastruktury osiedlowej – zakwalifikowało 17 zadań, w ramach projektów o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (Kategoria III) – również wskazano 17 zadań.

Wyniki aktywności osiedli w głosowaniu w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. (Kategoria II)

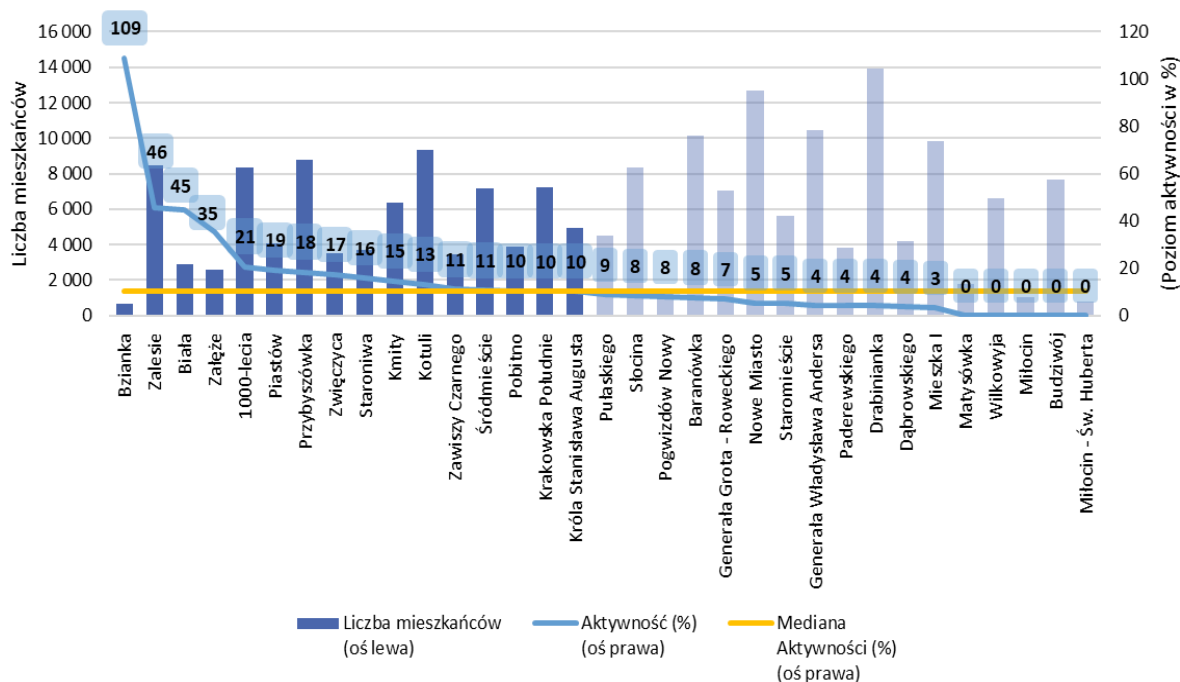


Jak przedstawia powyższa rycina bonus został przyznany dla Osiedla Bzianka – aktywność **108,81%**, co przełożyło się na realizację dodatkowego zadania pn. „Modernizacja wybranych pomieszczeń w remizie OSP Rzeszów – Bzianka” (umową dotacji nr ZKR 3/2022 z dnia 19.01.2022 r. na kwotę 200 000,00 zł). Osiedla wykazujące aktywność w głosowaniu nad RBO w ramach Kategorii II - nie mniej niż poziom Mediany (10%), stanowili 44% liczby mieszkańców ogółem (85 451 osób).

Wykonanie zadań realizowanych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

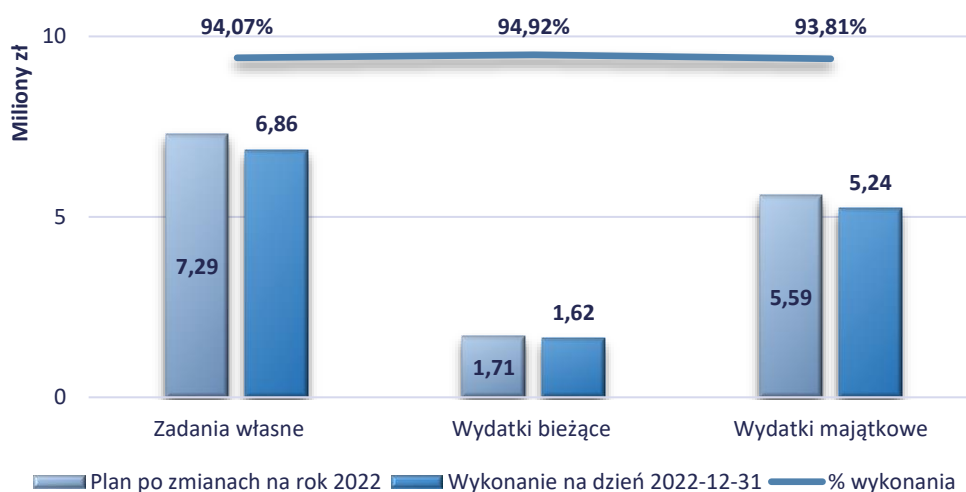


Rzeszowski Budżet Obywatelski w latach 2014-2022 – statystyki


Liczba oddanych głosów (wszystkich) w ramach RBO Miasta Rzeszowa w latach 2014 - 2022




Struktura głosów RBO Miasta Rzeszowa ze względu na liczbę ważnych głosów w latach 2014 - 2022



Struktura oddanych głosów w ramach RBO Miasta Rzeszowa wg sposobu głosowania w latach 2014 -2022



Porównanie RBO Miasta Rzeszowa z jednostkową stawką RBO w przeliczeniu na 1 oddany ważny głos w latach 2014 - 2022



Realizacja zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.

Kategoria I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej

1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Zalesie

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 799 200 zł

Wykonanie finansowe: 799 200 zł

Wykonanie rzeczowe: OSP Rzeszów-Zalesie umową dotacji nr ZKR 5/2022 z dnia 19.01.2022 r. otrzymała w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego kwotę 799 200,00 zł oraz umową dotacji nr ZKR 31/2022 z dnia 04.07.2022 r. otrzymała kwotę 14 000,00 zł z Urzędu Miasta Rzeszowa na zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rzeszów-Zalesie” – kwotę powyższą wykorzystywała w całości.

2. Doposażenie rzeszowskich przedszkoli w urządzenia rekreacyjne na place zabaw

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 1 000 000 zł

Wykonanie finansowe: 994 947,00 zł

Wykonanie rzeczowe: Zadanie zostało ujęte w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2022 - **Uchwała Nr LXXII/1575/2022** Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2022 r. (została podpisana umowa na realizację zadania, termin wykonania to 30 czerwca 2023 r.

3. Urządzenie parków miejskich w rejonie SP 18 przy ul. Bł. Karoliny i w rejonie ulic Starzyńskiego i Brydaka

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 1 000 000 zł

Wykonanie finansowe: 931 118,33 zł

Wykonanie rzeczowe: Zadanie było realizowane w podziale na dwa zadania:

- Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny, kwota wydatkowana - 583 961,25 zł, zakres wykonanych prac - wykonano odwodnienie terenu oraz nasadzono 1 020 szt. krzewów, 3 120 szt. roślin cebulowatych i 200 szt. traw.
- Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie ulic Starzyńskiego i Brydaka, kwota wydatkowana - 347 157,08 zł; zakres wykonanych prac - opracowano mapę do celów projektowych, wykonano utwardzenie terenu z wykorzystaniem 120 szt. płyt imitujących drewno oraz zamontowano: 2 szt. hamaków, 5 szt. ławek z oparciem, 5 szt. ławek w kształcie łuku, 3 szt. leżaków, 5 szt. koszy na śmieci. a także nasadzono 3 584 szt. roślin ozdobnych.



4. Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 1 000 000 zł

Wykonanie finansowe: 69 249,00 zł

Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana zgodnie z umową nr WI-R.7011.31.1.2022.ES z dnia 12.04.2022 r., z PWARD Sp. z o.o., Łańcut, o wartości 69 249 zł, z terminem wykonania do 21.11.2022 r. Kwota, z jaką zadanie zostało przyjęte do RBO na 2022 r., to 1 000 000 zł. Kwota robót według kosztorysu to: 2 245 532,23 zł. Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa zadanie zostało przesunięte na 2024 r.

Wykonanie rzeczowe: Dokumentacja projektowa na budowę budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój przy ul. Studzianki 11 w Rzeszowie. Charakterystyka budynku: wymiary ok. 8-10 m szerokości x 20-25 m długości, parterowy z poddaszem do zaadaptowania, dach dwuspadowy. Na parterze znajdować się będą: 3 szatnie wraz z sanitariatami, pomieszczenia gospodarcze, magazyn sportowy, pokój sędziowski z sanitariatami, toaleta dla kibiców oraz schody na poddasze.

Kategorii II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej

5.Arena-Park Zalesie – poprawa infrastruktury sportowej – kontenerowy zespół szatniowy. Osiedle Zalesie

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000zł

Wykonanie finansowe: Odstąpiono od realizacji zadania.

Wykonanie rzeczowe: Zakres zadania obejmował budowę kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na działce 2542/2 obr. 209 Zalesie. Gmina Miasto Rzeszów uzyskała warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej oraz do sieci elektroenergetycznej. Jednocześnie Gmina wystąpiła do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich ze względu na miejsce lokalizacji planowanej inwestycji. W dniu 13 kwietnia 2022 r. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał negatywną opinię budowy kontenerowego zaplecza szatniowo sanitarnego na terenie działki nr 2542/2 obr. 209. Przedmiotowa działka wchodzi w skład zespołu dworsko-parkowego w Zalesiu i jest wpisana do rejestru zabytków – nr rejestru: A-1007 z dnia 11.10.1978 r. Wobec powyższego nie było możliwości realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

6.Remont placu zabaw przy ul. Podchorążych. Osiedle 1000-Lecia

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 178 540,65 zł;

Wykonanie rzeczowe: Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową, wymiana elementów małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci.

7.Plac zabaw z boiskiem do sportów plażowych. Osiedle Przybyszówka

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 116 469,88 zł

Wykonanie rzeczowe: Opracowana została mapa do celów projektowych, zamontowano: 3 kpl. urządzeń siłowych, zestaw do street workoutu wraz ze strefami bezpieczeństwa z mat przerostowych, 1 kpl. lampy hybrydowej, stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz nasadzono 8 szt. drzew i założono 121 m² trawnika z siewu.

8.Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała. Osiedle Biała

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 199 616,00 zł

Wykonanie rzeczowe: OSP Rzeszów-Biała umową dotacji nr ZKR 1/2022 z dnia 19.01.2022. Przeprowadzono roboty budowlane obejmujące remont istniejących pomieszczeń OSP Rzeszów-Biała.

9. Zagospodarowanie na cele dydaktyczne sadu owocowego przy ul. Krajobrazowej i Panoramicznej. Osiedle Fr. Kotuli

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 195 761,52 zł

Wykonanie rzeczowe: Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową dla części elektrycznej, na terenie sadu owocowego wykonano ścieżkę z 253 szt. płyt betonowych, nasadzono 174 szt. krzewów oraz zamontowano: 11 szt. punktów świetlnych do podświetlenia drzew, koło wiedzy, kostki wiedzy, domki dla owadów, ławki.

10. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na osiedlu Kmity. Osiedle Kmity

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 223 133,07 zł

Wykonanie rzeczowe: ZTM wykonał ujęte w tym budżecie zadanie dotyczące ustawienia 9 stojaków rowerowych za łączną kwotę 14 993,70 zł brutto (kwota przeznaczona 15 000,00 zł).

MZD – zadanie wykonane w ramach umowy nr I.21.TU.2312.14.2022 z dnia 21.06.2022 pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na osiedlu Kmity”. Wykonawca zadania Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza "ROL-POL" Przewrotne, 36-003 Przewrotne, NIP 8130267438, REGON 000822699. Wartość wykonanego zadania 208 139,37 zł brutto.

Zakres wykonanych prac:

1. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z najezdami o powierzchni 227 m²
2. Odtworzenie oznakowania istniejących przejść dla pieszych – 28 m²
3. Montaż balustrad U11a – 70 m²
4. Przełożenie chodników z kostki brukowej – 438,8 m²

11. Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4. Osiedle Załęże

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 9 790,00 zł

Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana zgodnie z umową nr WI-R.7011.28.2022.PP z dnia 29.03.2022 r., z Land Art. Project s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych, Kraków, o wartości 9 790 zł, z terminem wykonania do 12.06.2022 r. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na roboty budowlane. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przygotowano i wszczęto kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku, którego zawarto umowę nr ZP.272.14.2023 z dnia 22.02.2023 r., z Grupa EPX Paweł Matera, Pustków, o wartości 177 000 zł, z terminem wykonania do 22.08.2023 r. Trwa realizacja robót budowlanych.

Wykonanie rzeczowe: Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji placu zabaw przedszkola oraz części rekreacyjno-sportowej szkoły przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w zakresie:

- 1) Dostawa i montaż elementów małej architektury,

- 2) Roboty ziemne,
- 3) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych,
- 4) Utwardzenie terenu z kostki betonowej otoczonej obrzeżem,
- 5) Zabezpieczenie istniejących kabli SN rurami dwudzielnymi,
- 6) Zagospodarowanie terenu,
- 7) Wykonanie nawierzchni trawiastej

12. Psi park – wybieg dla psów wzdłuż ul. Kolbego. Osiedle Baranówka

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 136 049,07 zł

Wykonanie rzeczowe: Zamontowano: 10 urządzeń zabawowych dla psów, 6 szt. ławek z oparciem, 3 szt. koszy na śmieci, 3 szt. koszy na psie odchody, 172 mb ogrodzenia wraz z 7 szt. bramek, 3 tablice regulaminowe.

13. Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10. Osiedle Piastów

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 5 890,00 zł

Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana zgodnie z umową nr WI-R.7011.26.2022.BJW z dnia 28.03.2022 r., z Land Art. Project s.c., Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych, Kraków, o wartości 5 890 zł, z terminem wykonania do 11.06.2022 r. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na roboty budowlane. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przygotowano i wszczęto kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku, którego zwarto umowę nr ZP.272.2.2023 z dnia 30.01.2023 r., z Grupą EPX Paweł Matera, 39-205 Pustków 288, o wartości 169 000 zł, z terminem wykonania 30.08.2023 r. Trwa realizacja robót budowlanych.

Wykonanie rzeczowe: Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 w zakresie:

- 1) Dostawa i montaż elementów małej architektury,
- 2) Roboty ziemne,
- 3) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych,
- 4) Utwardzenie terenu z kostki betonowej otoczonej obrzeżem,
- 5) Zabezpieczenie istniejących kabli SN rurami dwudzielnymi, zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów,
- 6) Rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu wizyjnego o 1 kamerę zewnętrzną na potrzeby monitorowania wykonywanego placu zabaw,
- 7) Zagospodarowanie terenu.

14. Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4. Osiedle Śródmieście

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 3 990,00 zł

Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana zgodnie z umową nr WI-R.7011.29.2022.BJW z dnia 30.03.2022 r.,

z Land Art. Project s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych, Kraków, o wartości 4 790 zł, z terminem wykonania do 13.06.2022 r.

Przygotowano i przeprowadzono przetarg na roboty budowlane. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przygotowano i wszczęto kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku, którego zwarto umowę nr ZP.272.113.2022 z dnia 30.01.2023 r., z Baydo sp. z o.o., Bydgoszcz, o wartości 253 380 zł, z terminem wykonania do 24.04.2023 r.

Wykonanie rzeczowe: Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie:

- 1) Demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń zabawowych,
- 2) Demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej z płytek gumowych wraz z podbudową oraz utylizacja materiałów z rozbiórki,
- 3) Roboty ziemne,
- 4) Wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej wylewanej poliuretanowej,
- 5) Dostawa i montaż urządzenia zabawowego,
- 6) Remont istniejących zestawów zabawowych,
- 7) Zagospodarowanie terenu,
- 8) Roboty towarzyszące

15. Remont ulicy Jerzego Pleśniarowicza. Osiedle Krakowska-Południe

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 220 527,93 zł

Wykonanie rzeczowe: Zadanie wykonane w ramach umowy nr I.9.TU. 2312..8.2022 pn. „Remont nawierzchni bitumicznych” Wykonawca zadania to DROGBUD GOLCOWA PRO Sp. z o.o.

Zakres Wykonanych prac: wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku od ul. Rataja do ul. Solarza o powierzchni 1 510 m²; przełożenie krawężników betonowych – 88 m². Przełożenie nawierzchni chodników – 183 m².

16. Modernizacja Domu Strażaka na osiedlu Bzianka. Osiedle Bzianka

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 200 000,00 zł

umowa dotacji nr ZKR 2/2022 z dnia 19.01.2022 r. na kwotę 200 000,00 zł

Wykonanie rzeczowe: Modernizacja Domu Strażaka.

17. Zakup profesjonalnego zestawu do prania i suszenia ubrań specjalnych oraz myjki do aparatów dla OSP Rzeszów-Słocina, Zdrowy Ratownik. Osiedle Słocina

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 190 000 zł

Wykonanie finansowe: 189 900,00 zł.

umową dotacji nr ZKR 4/2022 z dnia 19.01.2022 r.

Wykonanie rzeczowe: zakup profesjonalnego zestawu do prania i suszenia ubrań specjalnych oraz myjki do aparatów dla OSP Rzeszów-Słocina, Zdrowy Ratownik.

18. Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie. Osiedle Nowe Miasto

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 168 801,79 zł

Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana zgodnie z umową nr WI-R.7011.27.2022.1 z dnia 01.04.2022 r., z LandLAB Architektura Krajobrazu Katarzyna Wątor-Kmita, Skawina, o wartości 18 449 zł, z terminem wykonania do 10.06.2022 r.

Przygotowano i przeprowadzono przetarg na roboty budowlane, w wyniku, którego zawarto umowę nr ZP.272.94.2022 z dnia 23.09.2022 r., z Akar Sp. z o.o., Rzeszów, o wartości 214 508,11 zł, z terminem wykonania do 30.12.2022 r. Roboty budowlane zostały zakończone

Wykonanie rzeczowe: Wykonanie robót budowlanych na terenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie polegających na:

- 1) Dostawa i montaż elementów małej architektury
- 2) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerosowych
- 3) Demontaż istniejącego placu z podbudową oraz utylizacja materiałów z rozbiórki
- 4) Dowiezienie ziemi i niwelacja terenu
- 5) Zasianie trawy
- 6) Roboty towarzyszące



19. Rozbudowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej. Osiedle Zwiężczyca

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: niezrealizowane

Wykonanie rzeczowe: Ze względu na długi czas oczekiwania na urządzenia zabawowe nie można było zrealizować zadania do końca 2022 r.

20. Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 205 179,97 zł

Wykonanie rzeczowe: opracowano mapę i uiszczono opłatę z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej; na placu zabaw na osiedlu Staroniwa zamontowano elementy edukacyjne: panel sensoryczny, ekomemory, koło optyczne, krzywe zwierciadło, pisanie lustrzane, kinematograf, deszcz, głuchy telefon, piaskownicę, karuzelę, huśtawkę wahadłową podwójną, biblioteczkę, ławki, kosze na śmieci, ponadto nasadzono 210 szt. roślin ozdobnych oraz utwardzono 243 m² terenu.

21. Utwardzenie połączenia ścieżki rowerowej - przedłużenie ul. Piaskowej do ul. Kwiatkowskiego obok stawów przy rzece Wisłok

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł

Wykonanie finansowe: 260 967,19 zł

Wykonanie rzeczowe: Zadanie wykonane w ramach umowy nr I.9.TU.2312.8.2022 pn. „Remont nawierzchni bitumicznych”. Wykonawca zadania to DROGBUD GOLCOWA PRO Sp. z o.o. Wartość zadania to 260 967,19 zł brutto.

Zakres wykonanych prac:

Długość ścieżki rowerowej – 644,0 m

Szerokość ścieżki rowerowej – od 1,5 m do 2,0 m (w granicach pasa dr.)

Powierzchnia nawierzchni ścieżki rowerowej – 1 185,8 m²

Ścieżkę rowerową wykonano z mieszanki mineralno-bitumicznej na podbudowie z betonu i kruszywa łamanego.

Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym

22. Organizacja 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Zalesie

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 50 000,00 zł

Wykonanie rzeczowe: W ramach zadania zorganizowano piknik strażacki, który odbył się 18 czerwca 2022 r. na placu przed budynkiem OSP Rzeszów-Zalesie (ul. Robotnicza 15). Podczas pikniku odbyły się pokazy strażackie, pokazy ratownictwa medycznego, rodzinne zabawy i konkursy z nagrodami, animacje, w tym: malowanie twarzy, strefa balonowa, fotobudka, a także urządzenia rekreacyjne typu dmuchańce czy karuzela. Uczestnicy skorzystali również z bezpłatnego poczęstunku. Ponadto 26 czerwca 2022 r. odbyły się oficjalne obchody 100-lecia OSP Rzeszów-Zalesie w budynku OSP Rzeszów-Zalesie (ul. Robotnicza 15). W ramach zadania została sfinansowana m.in. tablica pamiątkowa, koszulki okolicznościowe czy catering. Podczas obchodów wystąpiła Orkiestra Dęta WSK „PZL-Rzeszów”.



23. Senior aktywny kulturalnie

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 50 000,00 zł

Wykonanie rzeczowe: Do realizacji zadania publicznego wybrano Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet VICTORIA, z którym została podpisana umowa nr 57/2022/PS z dnia 14 kwietnia 2022 roku.

Celem zadania była aktywizacja seniorów poprzez zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych, integrację środowiska oraz motywowanie do poprawy jakości życia seniorów. Działania kierowane były głównie do emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora oraz Kole Emerytów i Rencistów działających w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia w Rzeszowie. W ramach zadania zrealizowano wieczorki poetyckie, wieczorki muzyczne oraz 2 wycieczki.

24. Łączy nas piłka – organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 50 000,00 zł

Wykonanie rzeczowe: Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój w Rzeszowie

Celem zadania było przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców Rzeszowa, m.in. poprzez prowadzenie treningów piłkarskich. W tym celu niezbędny był zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć, zapewnienie kadry trenerskiej/ instruktorskiej oraz transportu na zajęcia w okresie halowym. Dodatkowo zadanie przewidywało wspieranie aktywności

sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie poprzez ufundowanie nagród dla uczniów najbardziej aktywnych sportowo oraz przekazaniu sprzętu sportowego niezbędnego do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dzieci. Zakładanym rezultatem zadania była edukacja sportowo-ruchowa, promocja zdrowego stylu życia, poprawa sprawności ruchowej, przeciwdziałanie patologiom wśród młodego pokolenia, a przez osiągnięcia sportowe – promowanie wizerunku miasta Rzeszowa.

25. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2022

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 50 000,00 zł

Wykonanie rzeczowe: Zadanie zrealizowane przez Fundację Jednego Serca Jednego Ducha w oparciu o udzieloną dotację celową z zakresu kultury, na podstawie umowy. W ramach zadania w dniu 16 czerwca odbył się bezpłatny koncert w Parku Sybiraków w Rzeszowie.



26. MOC ODKRYWCÓW – Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 50 000,00 zł

Wykonanie rzeczowe: Organizacja pikniku promującego Gminę Miasto Rzeszów

27. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 50 000,00 zł

Wykonanie rzeczowe: Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów. Celem zadania było szkolenie dzieci z zakresu gry w piłkę nożną. W tym celu niezbędny był wynajem obiektów sportowych, zapewnienie

kadry trenerskiej, zakup strojów piłkarskich oraz sprzętu treningowego. Klub zapewnił promocję zadania poprzez dystrybucję ulotek lub plakatów w rzeszowskich placówkach oświatowych. Zakładanym celem zadania było spowodowanie, aby dzieci, które odnalazły w sobie talent do piłki nożnej, zechciały kontynuować treningi w jednym z rzeszowskich klubów.

28. „Spotkania muzyczne na osiedlu F. Kotuli”

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 49 998,97 zł

Wykonanie rzeczowe: W ramach zadania zorganizowano 5 bezpłatnych kameralnych koncertów w różnych miejscach na terenie osiedla: Somethingski - Nikodema Soszyńskiego (14 maja) oraz Patryka Mateja (11 czerwca), Loli i Przema akustycznie (3 lipca), Filharmonia Mobilnie (28 sierpnia), Kobiątka i Majewski (4 września). Spotkania muzyczne na osiedlu Kotuli miały wymiar kulturalny, edukacyjny i przede wszystkim integracyjny



29. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców osiedla Kmity

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 49 717,33 zł

Wykonanie rzeczowe: W ramach realizacji zadania zorganizowano piknik rodzinny na osiedlu Kmity w dniu 4 czerwca, podczas którego odbył się koncert Danuty Błażejczyk wraz z Zespołem. Poniesiono koszty związane ze sceną, nagłośnieniem, gażą artystów, plakatami (promocja), cateringiem i

noclegiem dla artystów, jak również ZAiKS. Ponadto w ramach zadania zorganizowano 2 wycieczki dla seniorów z osiedla Kmity. Wydarzenia odbyły się w miesiącu sierpniu. Mieszkańcy mogli zobaczyć Sandomierz oraz Bieszczady.

30. Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Miasto Rzeszów jako zadanie zapobiegające bezdomności zwierząt

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 47 740,00 zł

Wykonanie rzeczowe: Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów wykonywane były w dwóch gabinetach weterynaryjnych zlokalizowanych przy al. Wyzwolenia 11 i al. Rejtana 33. W ramach powyższego zadania wykonano 177 zabiegów kastracji/sterylizacji kotów i 26 zabiegów kastracji/sterylizacji psów.

31. W parku zagraj z Zimowitem

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 50 000,00 zł

Wykonanie rzeczowe: Ludowy Klub Sportowy Zimowit Rzeszów. Celem zadania było systematyczne prowadzenie treningów piłkarskich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich w wieku 7-19 lat oraz urozmaicenie tych zajęć treningami ogólnorozwojowymi i siłowymi. Na potrzeby prowadzenia zajęć klub zapewniał kadrę trenerską i instruktorską, zakupił niezbędny sprzęt sportowy, wynajmował hale, sale i boiska sportowe. Dodatkowo klub prowadził działania promocyjne dotyczące zadania poprzez wykup reklamy banerowej w Internecie, która promowała nabory uzupełniające, w okresie prowadzenia zadania. Zakładanym celem zadania było utrzymanie zainteresowania ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, uprawianie sportu, w szczególności uprawianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.

32. Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 50 000,00 zł

Wykonanie rzeczowe: Do projektu zakwalifikowało się 12 szkół ponadpodstawowych z Rzeszowa. Zespół Szkół nr 2 został wyznaczony jako jednostka koordynująca ww. zadanie RBO, w tym przeprowadzenie postępowania i udzielenia zamówienia publicznego. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniona została firma Revas sp. z o.o., która odpowiadała za zrealizowanie zadania RBO, zgodnie z zawartą umową. W ramach realizacji zadania RBO firma Revas sp. z o.o. przekazała licencje na program komputerowy Branżowe Symulacje Biznesowe Revas każdej z 12 szkół oraz przeprowadziła szkolenia dla nauczycieli wyznaczonych z 12 szkół, dotyczące obsługi programu komputerowego (potwierdzone certyfikatem trenera). Do projektu zostało zgłoszonych 2296 uczniów z 12 szkół.

33. Centrum nowoczesnej awiacji z użyciem dronów przy Szkole Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 49 979,63 zł

Wykonanie rzeczowe: Celem zadania było stworzenie pracowni służącej do praktycznego wykorzystania dronów w edukacji pn. „Mini centrum nowoczesnej awiacji” oraz cykl zajęć z zakresu obsługi, sterowania oraz programowania dronów edukacyjnych. Pracownia powstała w budynku SP nr 25. W zajęciach przeprowadzonych z dziećmi uczęszczającymi do rzeszowskich szkół zostały wykorzystane programowalne drony edukacyjne Tello Edu Let Creativity Fly. Cykl zajęć pozwolił uczniom rozwinąć kompetencje programistyczne, jak również z zakresu obsługi i pilotowania dronów. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach.

34. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 50 000,00 zł

Wykonanie rzeczowe: W ramach zadania zorganizowano imprezę plenerową w dniu 11 września na terenie parku przy Szkole Podstawowej nr. 10. Podczas wydarzenia dla uczestników zapewniono obsługę konferansjera i animatorów, dmuchane atrakcje, zorganizowano rodzinne gry sportowe, występ zespołu BENDNICY i Pokaz Show Tanecznego. W ramach działania opłacono zabezpieczenie medyczne imprezy, poczęstunek dla mieszkańców i promocję wydarzenia.

35. ZST Dzieciom – Bajka o słoniku Bartusiu. Spektakl edukacyjny dla dzieci z rzeszowskich przedszkoli

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 15 000 zł

Wykonanie finansowe: 14 991,70 zł

Wykonanie rzeczowe: W ramach działania Koła Teatralnego zrealizowano spektakl, którego adresatem były dzieci z rzeszowskich przedszkoli i najmłodszych klas szkół podstawowych – ok. 600 osób. Uczniowie ZST przygotowali bajkę edukacyjną „O słoniku Bartusiu”. Z pozyskanych środków zakupiono nagłośnienie bezprzewodowe, materiały niezbędne do zrealizowania przedstawienia (kostiumy, materiały plastyczne do scenografii oraz nagrody dla uczniów i przedszkolaków biorących udział w konkursie). Odbłyło się 5 spektakli w terminie 23-25 maja 2022 r. oraz specjalne przedstawienie tłumaczone na j. ukraiński dla dzieci uchodźców – ok. 60 (czerwiec 2022). W realizację projektu została włączona Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.

36. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z osiedla Krakowska-Południe

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 49 889,87 zł

Wykonanie rzeczowe:

W ramach zadania zorganizowano: imprezę osiedlową „Powitanie Lata” – uczestnicy mogli skorzystać z darmowych atrakcji, m.in.: dmuchane zjeżdżalnie, roller wodny, modelowanie baloników, malowanie

buziek i brokatowe tatuaże; wycieczkę dla dzieci do kompleksu Brzezówka – w wycieczce wzięło udział 52 dzieci z osiedla Krakowska-Południe; wycieczkę do Warszawy dla seniorów 50+ (skorzystało 52 seniorów z Osiedla Krakowska-Południe). W ramach wycieczki zwiedzono Świątynię Opatrzności Bożej, Pałac w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Park Wilanowski i warszawską Starówkę; Osiedlowy Turniej Piłkarski Krakowska-Południe – w rywalizacji wzięło udział 13 zespołów, podzielonych na 4 kategorie wiekowe, wszystkie drużyny otrzymały piłki, a najlepsze zespoły puchar oraz nagrody indywidualne dla każdego zawodnika, każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal.

37. Pożegnanie lata na osiedlu Zwiączyca

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 40 000 zł

Wykonanie finansowe: 39 942,89 zł

Wykonanie rzeczowe: w ramach zadania zorganizowano imprezę plenerową dla mieszkańców miasta wraz z koncertami, warsztatami, konkursami, zabawami oraz animacjami. Podczas wydarzenia:

- odbył się koncert Zespołu Zbóje oraz Patryka Mateja,
- przygotowano animacje dla najmłodszych mieszkańców (pokaz gigantycznych baniek mydlanych, zabawy z gigant chustą, rodzinne zabawy, tunel, przeciąganie liny, rzuty do celu, strzelanie z łuku, malowanie włosów),
- zorganizowano pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, symulatora dachowania, warsztaty malowania na wodzie, a także konkursy rodzinne.

38. Jadłodzielnia Rzeszów – Dziel się i częstuj!

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł

Wykonanie finansowe: 0,00 zł

Wykonanie rzeczowe: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak podmiotów zainteresowanych; konkurs został unieważniony zarządzeniem nr VIII /1694/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 lutego 2022 r., planowane jest ogłoszenie konkursu na realizację tego zadania w 2023 roku.
